

郡山城白沢門櫓台石垣整備工事完了について（お知らせ）

平成30年9月16日付けで、お知らせいたしました郡山城白沢門櫓台石垣整備工事について、令和元年6月30日をもって完了し、7月11日に完了検査を実施いたしました。

当初は平成31年3月31日までの予定でしたが、1月8日開催の第6回整備委員会において、石垣修復範囲の拡張等、委員より指導があったため行政機関と協議の上、工期を延長しました。

なお、引き続き極楽橋再建整備事業のため当面通行止めとなりますが、ご理解ご協力をお願い申し上げます。

【工事名】 郡山城白沢門櫓台石垣整備工事

【工事場所】 大和郡山市城内町地内

【工事内容】 仮設工・土工・解体工・石積工

【工事期間】 平成30年9月18日～令和元年6月30日

【請負業者】 (株)栗田建設

【現況写真】

<完了検査>




着工前



完工



●南櫓台
着工前

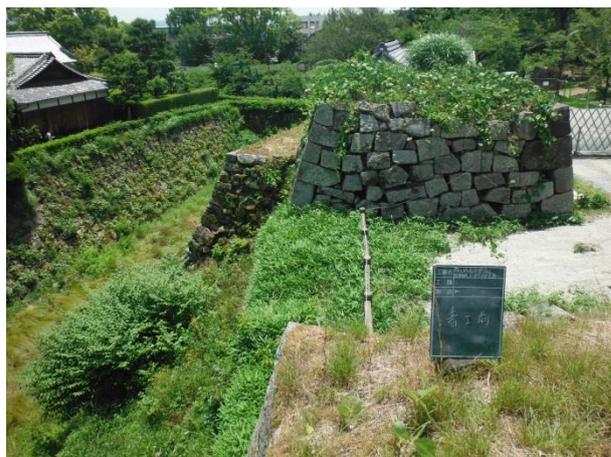

完工



●北櫓台

着工前



完工

